Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ АО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

П 00-13.02-2018

Москва, 2018 г.

Предисловие

Настоящий Стандарт организации устанавливает порядок согласования и возмещения дополнительных работ в АО «Институт Теплоэлектропроект».

1. РАЗРАБОТЧИКИ:

Директор по экономике и финансам	И. Троян	И.Г. Троян
Начальник планово-экономического отдела		А.М. Морозов

2. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «10» 08 2018г. № 97

3. ВЗАМЕН Положения «Порядок согласования и возмещения дополнительных работ ОАО «Институт Теплоэлектропроект», введенного приказом от 2015г. №85

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

Оглавление

1.Назначение документа 4

2.Принятые сокращения..... 4

3.Порядок согласования дополнительных работ 4

4. Порядок возмещения дополнительных работ 7

5.Приложения..... 8

1 Назначение документа

1.1. Настоящее положение «Порядок согласования и возмещения дополнительных работ в АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и регулирует порядок взаимоотношений АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «Институт Теплоэлектропроект» по вопросам согласования и возмещения дополнительных работ по:

– корректировке документации, принятой АО «ТЭК Мосэнерго»;

– разработке новой документации, не предусмотренной договором на проектирование.

1.2. Для выполнения дополнительных работ АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «Институт Теплоэлектропроект» заключают рамочное дополнительное соглашение к существующему договору на проектирование или заключают между собой новый договор.

1.3. Не допускается внесение АО «Институт Теплоэлектропроект» изменений в документацию по устному распоряжению инициатора изменений.

1.4. Схема процесса представлена в Приложении №4 к настоящему Положению.

2 Принятые сокращения

2.1 Структурные подразделения и должности АО «Институт Теплоэлектропроект»:

– ГИП - главный инженер проекта;

– ПЭО – планово-экономический отдел;

– ОП - отдел персонала.

2.2 Структурные подразделения АО «ТЭК Мосэнерго»:

– УКПиЭ - управление корпоративного планирования и экономики;

– УпРП - правление по работе с персоналом;

– филиалы по строительству объектов АО «ТЭК Мосэнерго»

2.3 **Документация** – проектная и (или) рабочая документация, а также иная документация, разрабатываемая АО «Институт Теплоэлектропроект» для АО «ТЭК Мосэнерго» по договору на проектирование.

2.4 **СМР** – строительно-монтажные работы.

3 Порядок согласования дополнительных работ

3.1 Филиал по строительству АО «ТЭК Мосэнерго», при выявлении необходимости выполнения дополнительных работ, направляет письмо за подписью директора филиала по строительству в АО «Институт Теплоэлектропроект» с приложением задания на дополнительные работы по форме Приложения №1 к настоящему положению, подписанным у директора филиала по строительству и заполненными следующими полями формы:

– Наименование объекта;

- Наименование работ;
- Обоснование необходимости выполнения работ;
- Сроки выполнения работ;
- Источник компенсации затрат.

Источник компенсации затрат по дополнительным работам содержит название организации за чей счет планируется возмещать дополнительные затраты (наименование заказчика, субподрядчика, поставщика, филиал по строительству, АО «Институт Теплоэлектропроект»).

К письму прикладываются обосновывающие материалы в форме предложений или требований заказчика/ субподрядчика/ поставщика, протоколы совещаний и т.п.

3.2 ГИП в течение 2-х рабочих дней при получении задания на дополнительные работы:

- осуществляет анализ обоснованности выполнения дополнительных работ;
- дает заключение, являются ли данные работы дополнительными;
- при признании дополнительных работ обоснованными:
  - определяет трудоемкость дополнительных работ в соответствии с базовыми перечнями и нормативами трудозатрат на разработку рабочей документации для строительства;
  - совместно с начальниками производственных отделов АО «Институт Теплоэлектропроект» определяет трудоемкость дополнительных работ, составляет перечень специалистов или определяет количество специалистов, выполняющих данные работы, срок выполнения дополнительных работ и направляет заявку на составление калькуляции стоимости выполнения дополнительных работ по электронной почте начальнику ПЭО в формате Приложения № 2 к настоящему Положению.
  - составляет график выдачи документации;
  - формулирует позицию АО «Институт Теплоэлектропроект» об источнике компенсации затрат по дополнительным работам.

3.3 ПЭО в течение одного рабочего дня формирует и предоставляет ГИП за подписью директора по экономике и финансам АО «Институт Теплоэлектропроект» расчет стоимости работ по форме «Расчет стоимости дополнительных работ по проекту» по форме Приложения №3 к настоящему Положению.

ПЭО оперативно получает от ОП данные по средней зарплате каждого заявленного специалиста.

3.4 ГИП в течение одного рабочего дня, по получению расчета по п.3.3, формирует и направляет письмо за подписью Генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект» в адрес директора филиала по строительству:

- при отказе в проведении дополнительных работ:
  - мотивированный отказ;
- при признании дополнительных работ обоснованными:

- подписанное Генеральным директором АО «Институт Теплоэлектропроект» задание на дополнительные работы по форме Приложения №1, и заполненным полем формы - «Стоимость работ» и «Источник компенсации затрат».

Источник компенсации затрат по дополнительным работам содержит название организации за чей счет планируется возмещать дополнительные затраты (наименование заказчика, субподрядчика, поставщика, филиал по строительству, АО «Институт Теплоэлектропроект».)

- расчет стоимости дополнительных работ по проекту по форме Приложения №3 к настоящему положению с приложением;
- график выдачи документации.

3.5 Филиал по строительству в случае отказа АО «Институт Теплоэлектропроект» на проведение дополнительных работ может инициировать совещание с участием заинтересованных сторон в разрешении вопроса.

3.6 Филиал по строительству при получении от АО «Институт Теплоэлектропроект» документов по п.3.4. в течение двух рабочих дней:

– проверяет объем и сроки проведения дополнительных работ, заявленный АО «Институт Теплоэлектропроект»;

– при согласии с объемом и сроками проведения дополнительных работ, направляет по электронной почте в адрес УпРП и УКПиЭ АО «ТЭК Мосэнерго» расчет стоимости дополнительных работ по проекту с приложением, на согласование.

3.7 УпРП и УКПиЭ АО «ТЭК Мосэнерго» в течение одного рабочего дня проверяют и визируют расчет стоимости дополнительных работ по проекту и направляют завизированный расчет в филиал по строительству.

3.8 Директор филиала по строительству после согласования УпРП и УКПиЭ АО «ТЭК Мосэнерго» стоимости дополнительных работ в течение одного рабочего дня визирует расчет стоимости дополнительных работ по проекту и выносит следующие материалы на рассмотрение первого заместителя генерального директора по строительству объектов генерации АО «ТЭК Мосэнерго»:

– задание на дополнительные работы;

– материалы, обосновывающие дополнительные работы;

– обоснование стоимости работ по форме «Расчет стоимости дополнительных работ по проекту»;

– график выдачи документации;

– позицию филиала по строительству и АО «Институт Теплоэлектропроект» об источнике компенсации затрат по дополнительным работам.

3.9 Заместитель генерального директора по строительству АО «ТЭК Мосэнерго» при участии Генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект» в срок не позднее 2 рабочих дней принимает решение:

– об утверждении задания на дополнительные работы;

– о принятии затрат на выполнение дополнительных работ на счет АО «ТЭК Мосэнерго» и/или АО «Институт Теплоэлектропроект»;

– о выставлении стоимости дополнительных работ стороне, чьи действия привели к необходимости выполнения дополнительных работ;

– об инициировании заключения договоров/дополнительных соглашений с субподрядчиками, поставщиками, заказчиком;

– о проведении дополнительных работ в особом порядке.

3.10 Утвержденное задание на дополнительные работы направляется в адрес филиала по строительству и АО «Институт Теплоэлектропроект» и является основанием для начала работ для АО «Институт Теплоэлектропроект». Сопроводительное письмо к заданию на дополнительные работы подписывается первым заместителем генерального директора по строительству объектов генерации АО «ТЭК Мосэнерго» и содержит указание на источник компенсации затрат по дополнительным работам.

3.11 Общая схема процесса согласования дополнительных работ представлена в Приложении №4.

4 Порядок возмещения дополнительных работ

4.1 Дополнительные работы, вызванные действиями АО «ТЭК Мосэнерго», компенсируются за счет АО «ТЭК Мосэнерго».

4.2 Дополнительные работы, вызванные действиями АО «Институт Теплоэлектропроект», компенсируются за счет АО «Институт Теплоэлектропроект».

4.3 Если дополнительные работы вызваны действиями поставщика/ субподрядчика/заказчика, то филиал по строительству по принятому по п.3.9. решению в течение 2 рабочих дней уведомляет сторону, чьи действия привели к необходимости дополнительных работ (заказчика/субподрядчика/поставщика), о стоимости работ и компенсации дополнительных затрат на выполнение проекта, направляя в ее адрес письмом:

– расчет стоимости дополнительных работ по проекту;

– материалы, обосновывающие корректировку документации.

4.4 Филиал по строительству получает ответ на предложение компенсации затрат от стороны, чьи действия привели к необходимости выполнения дополнительных работ.

4.5 Филиал по строительству, в случае если заказчик/субподрядчик/поставщик подтверждает готовность компенсировать затраты по дополнительным работам, инициирует заключение дополнительного соглашения/договора с заказчиком/субподрядчиком/поставщиком на проведение дополнительных работ (или получает гарантийное письмо об оплате дополнительных работ) в порядке, определенном локальными нормативными актами АО «ТЭК Мосэнерго» по договорной работе.

4.6 В случае если заказчик/субподрядчик/поставщик не подтверждает готовность компенсировать затраты по дополнительным работам, филиал по строительству в течение одного рабочего дня с момента получения таковой информации уведомляет о данном факте заместителя генерального директора по строительству.

4.7 Первый заместитель генерального директора по строительству объектов генерации АО «ТЭК Мосэнерго» выносит вопрос о компенсации затрат по дополнительным работам на генерального директора АО «ТЭК Мосэнерго».

4.8 Генеральный директор АО «ТЭК Мосэнерго» принимает решение о целесообразности проведения дополнительных работ и источниках их финансирования (за счет АО «ТЭК Мосэнерго» и/или ОАО «Институт Теплоэлектропроект»).

4.9 АО «Институт Теплоэлектропроект» выполняет дополнительные работы в соответствии с дополнительным соглашением/договором с АО «ТЭК Мосэнерго» и заданием на дополнительные работы, полученным по п.3.9 и предоставляет отчет о фактических затратах» по форме «Расчет стоимости дополнительных работ по проекту».

5 Приложения

Приложение №1. Форма задания на дополнительные работы.

Приложение №2. Форма заявки на составление калькуляции стоимости выполнения дополнительных работ.

Приложение №3. Форма расчета стоимости дополнительных работ по проекту.

Приложение №4. Схема процесса согласования дополнительных работ

Приложение №1

Форма задания на дополнительные работы

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора АО «ТЭК Мосэнерго» по
строительству

_____ Ф.И.О.

«____» _____

Задание на дополнительные работы
№___

Наименование объекта	
Обоснование необходимости выполнения работ	
Источник компенсации затрат:	
- позиция филиала по строительству	
- позиция АО «Институт Теплоэлектропроект»	

№ пп	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Стоимость работ

Приложение:

1. Обоснование стоимости работ по форме «Расчет стоимости дополнительных работ по проекту» на _____ листах.
2. График выдачи документации на _____ листах.

Директор филиала по строительству _____ Ф.И.О.
Генеральный директор
АО «Институт Теплоэлектропроект» _____ Ф.И.О.

Приложение № 2

Форма заявки на составление калькуляции стоимости выполнения дополнительных работ

Заявка на составление калькуляции стоимости выполнения дополнительных работ

Заказчик: _____

Заявка от Заказчика: _____

№ письма и дата

Наименование работ: _____

Вид работ: (дополнительный объем, более ранний срок)

Источник компенсации затрат: _____

Продолжительность работ и период их выполнения: _____

Привлечение субподрядных организаций:

- наименование _____
- объем выполнения _____
- период выполнения _____

Трудоемкость работ собственными силами, чел-час _____

Количество специалистов
или Перечень специалистов

Наименование задачи	Код комплекта	Отдел	ФИО	Трудозатраты, чел-час
задача 1				
задача 1				
задача 1				
Итого по задаче 1				
задача 2				
задача 2				
задача 2				
Итого по задаче 2				
задача N				
задача N				
задача N				
Итого по задаче N				
Итого по доп.работам				

Главный инженер проекта ОАО "Институт Теплоэлектропроект" _____

Приложение №3

Форма расчета стоимости дополнительных работ по проекту

Расчет стоимости дополнительных работ по проекту

Наименование работ: **(наименование)**

Период выполнения работ: **(период, даты)**

№ п/п	Наименование	Расчет				Комментарии
		Итого, руб.	Трудозатраты, чел-час или чел.дни	Среднемесячная з/пл, руб./мес.	Норма рабочего времени, час/мес.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты на оплату труда производственного персонала		x	x	x	= Сумма п.1.1.-п.1.9.
1.1.	ТМО	= ст.4 x ст.5 / ст.6				Трудозатраты в чел-час определяются исходя из норм, разработанных в Институте на конкретную задачу. Данные представляются ГИПом со ссылкой на норму и нормативный документ (прил.2 к Расчету). Среднемесячная зарплата отдела рассчитывается как фактический среднемесячный заработок за предыдущие 12 месяцев на момент расчета (аналогично расчету отпускных). Расчет среднемесячной зарплаты отдела согласовывается с УпРП ТЭК МЭ. Норма рабочего времени определяется как средняя в месяц за период выполнения работ.
1.2.	ОВП	= ст.4 x ст.5 / ст.6				
1.3.	ОГС	= ст.4 x ст.5 / ст.6				
1.4.	СТО	= ст.4 x ст.5 / ст.6				
1.5.	СО	= ст.4 x ст.5 / ст.6				
1.6.	ОМК	= ст.4 x ст.5 / ст.6				
1.7.	ЭТО	= ст.4 x ст.5 / ст.6				
1.8.	ОАСУ	= ст.4 x ст.5 / ст.6				
1.9.	ОЭОС	= ст.4 x ст.5 / ст.6				
2.	Страховые взносы		x	x	x	= п.1 x 30%
3.	Амортизация ОПФ		x	x	x	= Сумма амортизации за текущий год по утв.БП /Общие затраты на оплату труда производственного персонала за текущий год по утв.БП x п.1
4.	Прочие прямые расходы (командировочные, обучение, канц.товары)		x	x	x	= Сумма прочих прямых расходов за текущий год по утв.БП /Общие затраты на оплату труда производственного персонала за текущий год по утв.БП x п.1
5.	Накладные расходы		x	x	x	= Сумма накладных расходов за текущий год по утв.БП /Общие затраты на оплату труда производственного персонала за текущий год по утв.БП x п.1
6.	Рентабельность		x	x	x	= (п.1.+п.2.+п.3.+п.4.+п.5.) x Норма прибыли
	ИТОГО		x	x	x	= п.1.+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6.

приложение: "Заявка на составление калькуляции стоимости выполнения дополнительных работ"

Источник компенсации затрат:

Позиция филиала по строительству: _____

Позиия ОАО "Институт ТЭП" _____

Генеральный директор ОАО "Институт ТЭП" _____ /Ф.И.О.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Институт ТЭП" _____ /Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала по строительству _____ /Ф.И.О.

Начальник УпРП ОАО "ТЭК Мосэнерго" _____ /Ф.И.О.

Начальник УКПиЭ ОАО "ТЭК Мосэнерго" _____ /Ф.И.О.
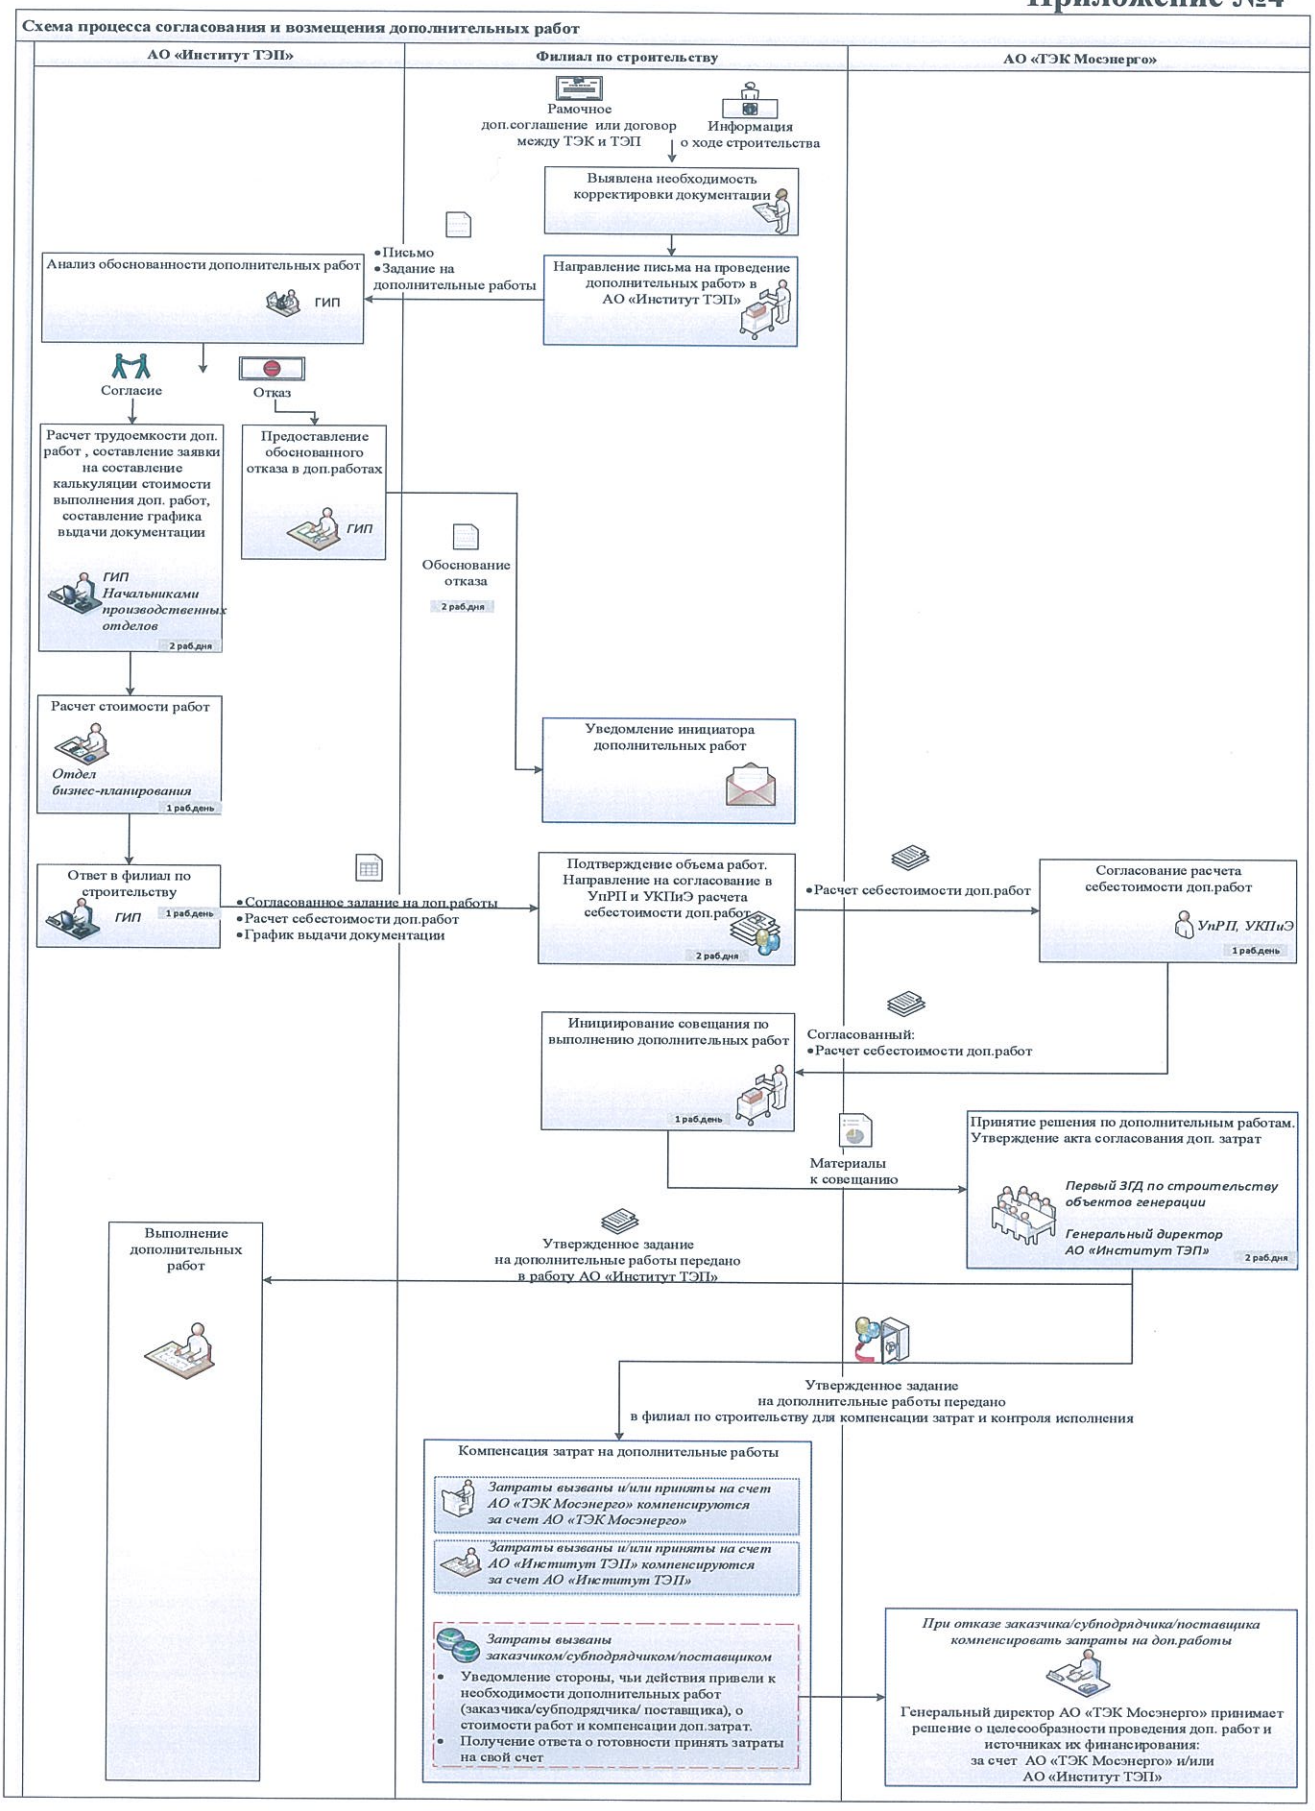
Приложение №4
